


Our lives first!




Operaciones de elevación

1   Safety green light

2 

3 

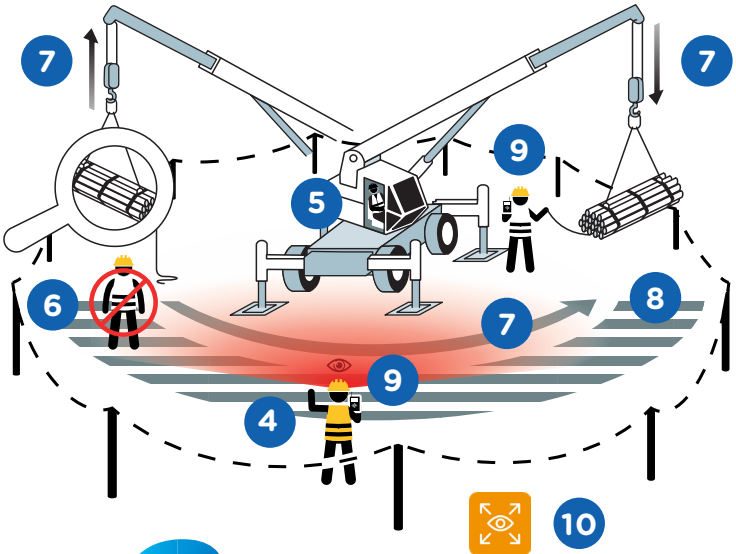

Operaciones de elevación



Lugar _____ Fecha _____

Empresa observada _____ N.º de permiso _____

SÍ **NO** **NA**

PUNTOS DE CONTROL

1 ¿Se han llevado a cabo la «sesión informativa previa al trabajo» y la «luz verde de seguridad»?

2 ¿Hay una carpeta aprobada para esta elevación?

3 ¿El equipo a cargo de la intervención utilizó la lista de verificación al iniciar la obra?

4 ¿Hay un señalero o jefe de maniobra designado e identificable?

5 ¿El operador del dispositivo de elevación tiene un certificado de capacitación o un documento que lo autorice a operar dicho dispositivo?

6 ¿Se ha delimitado físicamente una zona de acceso prohibido y no hay ninguna persona debajo ni cerca de la carga suspendida?

7 ¿La operación de elevación se realiza de acuerdo con el esquema de elevación o el procedimiento paso a paso? (Por ejemplo, en cuanto a las eslingas, la zona de salida y de llegada, la zona sobre la cual se desplaza la carga).

8 ¿No hay ningún equipo con presión debajo o cerca de la carga suspendida, a menos que esté previsto específicamente en la carpeta de esta elevación?

9 ¿Se supervisa la carga móvil durante la elevación?

10 ¿Están todas las personas implicadas en el trabajo debidamente situadas fuera de la línea de peligro, y las otras personas no implicadas en el trabajo, se mantienen bien alejadas?

Comentarios _____

Nombre y apellido _____ Empresa _____

Firma _____
