Nos vies avant tout !

GO X

Janvier 2025

Travaux sur cordes

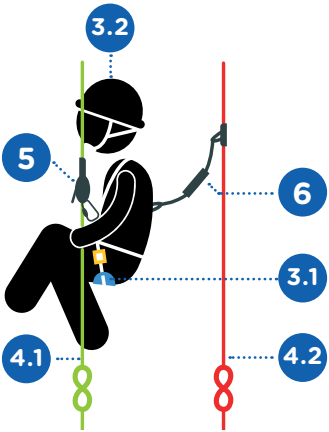

1 STOP GO Feu vert sécurité

2

10 SOS

11

7

8

9

12

TotalEnergies

FOR ME. FOR YOU. FOR ALL. SAFETY TotalEnergies

Travaux sur cordes

Lieu _____ Date _____

Entreprise observée _____ N° permis _____

OUI	NON	N/A		POINTS À VÉRIFIER
◯	◯	◯	1	Le «Pré-job briefing» et le «Feu vert sécurité» ont-ils été réalisés ?
◯	◯	◯	2	L'équipe est-elle composée de 2 personnes minimum, à jour de certification, dont 1 possédant les compétences de supervision ?
◯	◯	◯	3	Les cordistes portent-ils un harnais (3.1) et un casque avec jugulaire attachée (3.2) adaptés ?
◯	◯	◯	4	Chaque système est-il composé d'une corde de travail (4.1) et d'une corde de sécurité (4.2), ancrées séparément, et protégées d'éventuels frottements ou points chauds ?
◯	◯	◯	5	Le cordiste dispose-t-il d'un mécanisme de descente et remontée, ainsi que d'un système autobloquant qui empêche la chute ?
◯	◯	◯	6	Le cordiste dispose-t-il d'un dispositif antichute mobile avec absorbeur d'énergie, relié à la corde de sécurité ?
◯	◯	◯	7	Les outils et autres accessoires sont-ils sécurisés afin d'éviter les chutes d'objets ?
◯	◯	◯	8	Le matériel mis en œuvre est-il visuellement en bon état et à jour de vérification ?
◯	◯	◯	9	La communication (ex. orale ou radio) est-elle toujours maintenue entre les différents intervenants, y compris avec le personnel au sol?
◯	◯	◯	10	Le plan de sauvetage (y compris l'évacuation vers une zone sûre) est-il formalisé et a-t-il déjà été testé ?
◯	◯	◯	11	En cas de défaillance d'un cordiste, le plan de sauvetage peut-il être mis en œuvre par son (ou ses) équipier(s) ?
◯	◯	◯	12	Toutes les personnes impliquées dans le travail sont-elles bien positionnées hors de la ligne de danger; et les autres, non impliquées, sont-elles bien tenues à l'écart ?

Commentaires _____

Nom _____ Entreprise _____

Signature _____
