



**TotalEnergies**

## Tyra Redevelopment Update Medie-briefing

3. august 2022

*Martin Rune Pedersen, direktør  
TotalEnergies Danmark*




# Dagens meddelelse om Tyra og gasforsyningen




- Opstart af Tyra-feltet forsinket til vintersæsonen 2023/24
- Årsagen er en forsinkelse af procesplatformen under konstruktion på værftet i Indonesien
- TotalEnergies er fuldt fokuseret på at bringe Tyra tilbage i produktion hurtigst muligt
- DUC gas-eksport fortsætter – uden Tyra eksporterer vi omkring 2,5 mio. kubikmeter gas dagligt til Europa fra de sydlige DUC-felter
- Det nye Tyra II forventes at levere 2,8 mia. kubikmeter gas om året = 80% af den forventede danske gasproduktion

# Et komplekst og globalt megaprojekt

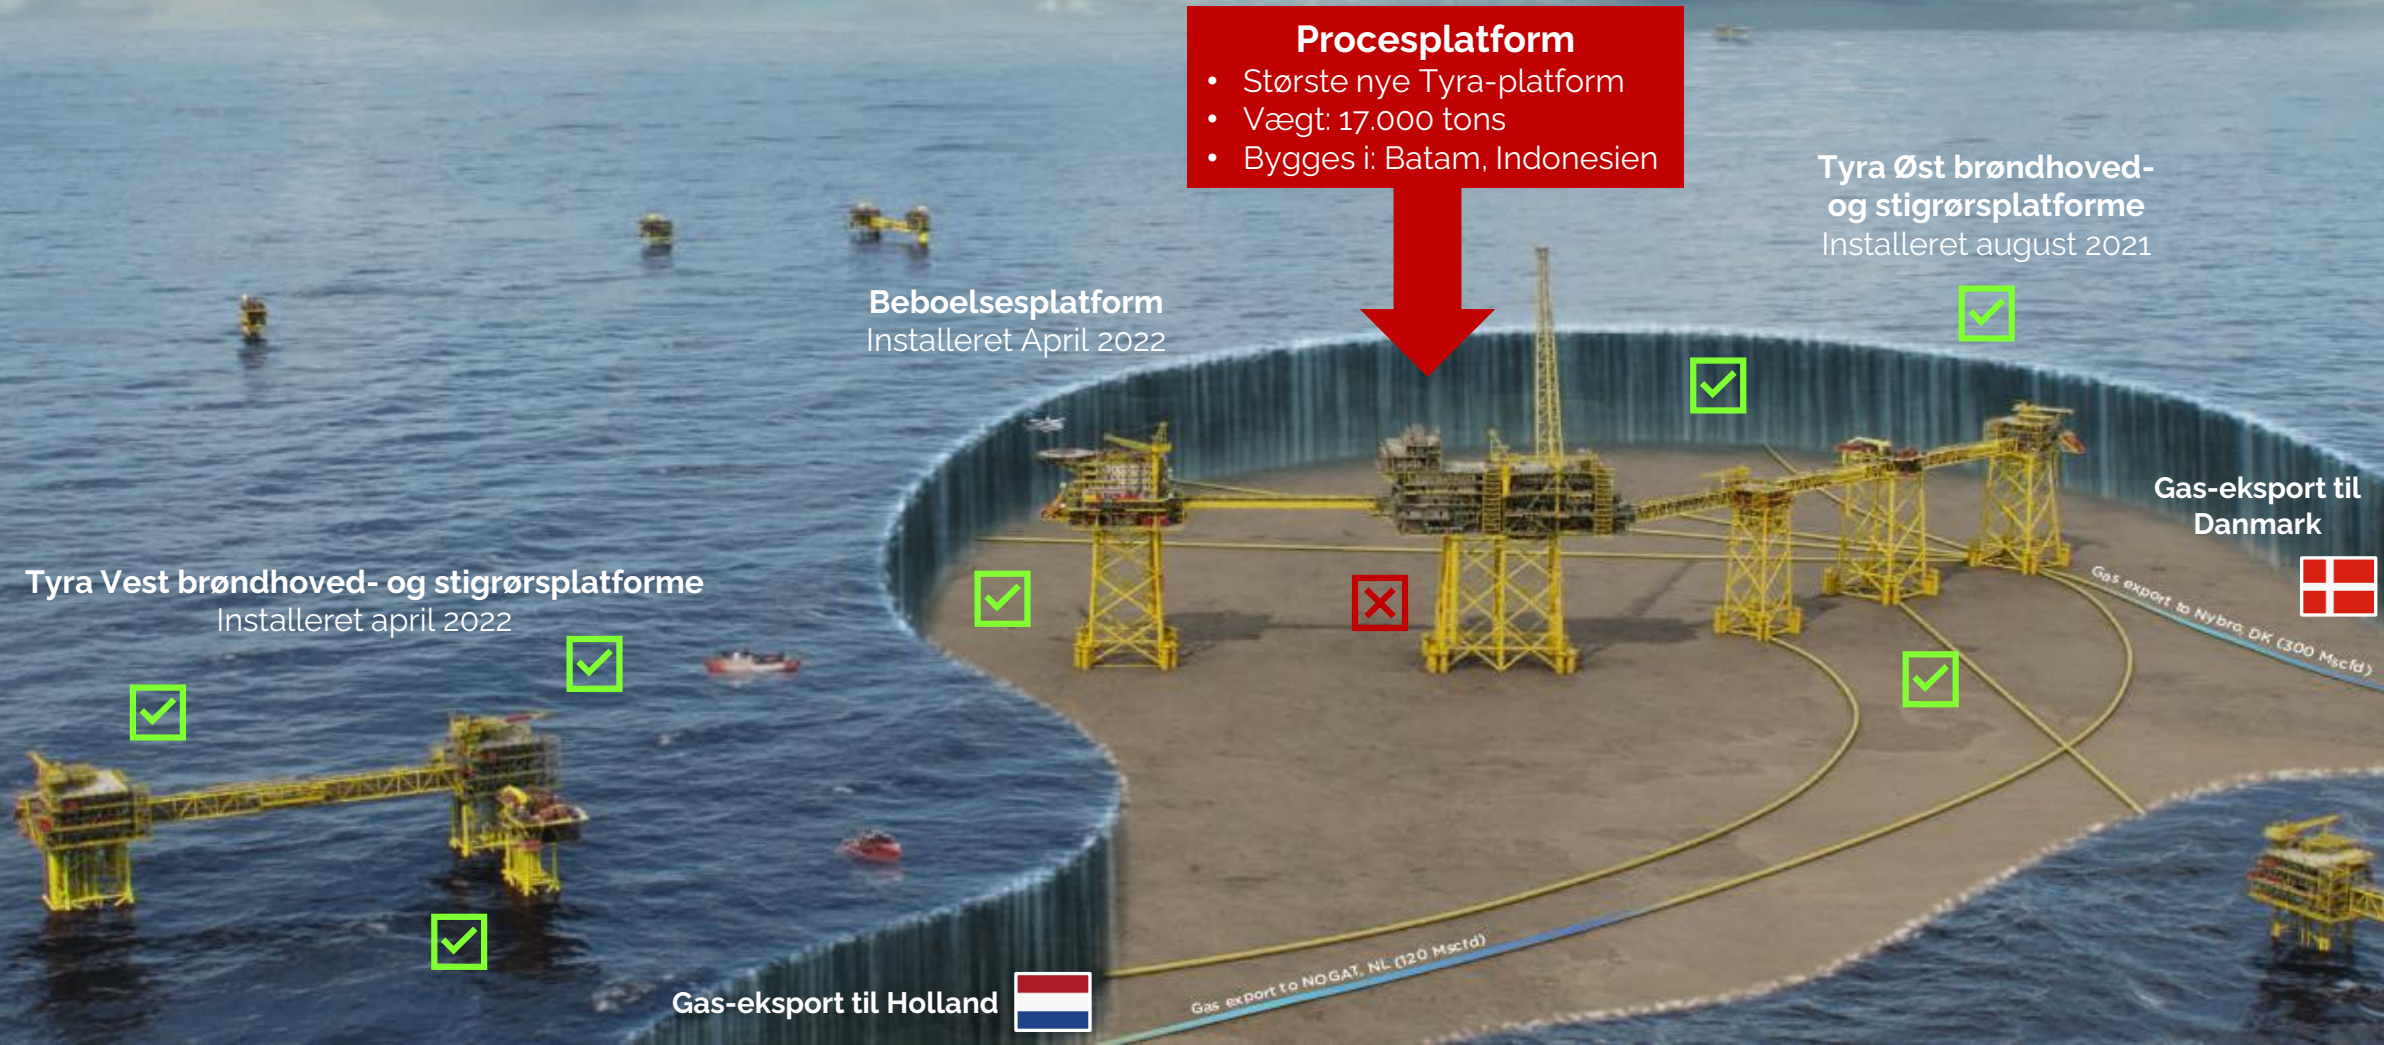



# Hovedfaktorer der påvirker opstart af Tyra



Følgevirkningerne af COVID-19 pandemien



Forsinkelser i konstruktionsarbejdet



Tilgængelighed af kran- og transportskibe



## Færdiggørelse af procesplatformen offshore – en stor opgave forude



- Installation af procesplatformen planlagt til oktober 2022
- Udestående arbejde på procesmodulet vil kræve mere end 500.000 extra mandetimer offshore
- Mere end 500 yderligere offshore-medarbejdere vil blive mobiliseret
- Vi har brug for fuld support fra den danske og internationale offshore-industri



# Øget gasproduktion fra den danske Nordsø



- Vi arbejder hårdt på at optimere gasproduktionen fra vores eksisterende felter
- Vi ser på mulighederne for at fremskynde boring af nye brønde til vintersæsonen 2023/24
